



PLAČIAJUOSTIS
I N T E R N E T A S

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“
2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA
(2014 METŲ IV KETVIRČIO VEIKLOS ATASKAITA)**

Vilnius, 2015

ĮSTAIGOS VEIKLA

Įstaigos veiklos tikslai yra:

1. tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į Įstaigos kapitalą, bei iš Įstaigos veiklos gautą pelną, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams;
2. teikti, rinkti, analizuoti ir skelbti socialinę ekonominę informaciją, organizuoti mokymus, leisti informacinius, metodinius ir pan. leidinius;
3. rengti projektus, teikti paraiškas jų įgyvendinimo finansavimui gauti ir juos įgyvendinti;
4. organizuoti informacinių technologijų tinklo eksploataciją, paslaugų panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą, teikimą.

Įstaigos misija:

Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį. Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams. Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje. Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

REIKŠMINGI 2014 M. ĮVYKIAI

2014 m. sausio 21 d. pasirašytas susitarimas su Susisiekimo ministerija, pagal kurį Įstaigai neatlygintinai naudotis buvo perduotas dalis projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (toliau – RAIN-2 projektas) metu sukurtas turto, kurio vertė – 23,79 mln. Lt.

2014 m. sausio 24 d. su ADB „Baltikums“ Lietuvos filialu pasirašyta sutartis dėl RAIN-2 projekto metu sukurto turto draudimo, kuria buvo užbaigtos pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu „RAIN-2 draudimo paslaugos“ procedūros.

2014 m. vasario 12 d. su UAB „Etel Networks“ pasirašyta sutartis dėl RAIN tinklo eksploataavimo, kuria buvo užbaigtos pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu „RAIN tinklo operatyvinė priežiūra“ procedūros.

2014 m. vasario 21 d. Susisiekimo ministerijoje vykusio susitikimo su Europos Komisijos atstovais metu Įstaiga pristatė RAIN-2 projekto įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus.

2014 m. kovo 14 d. Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BR1-197 patvirtintas Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“, sąrašas, kuriame numatomam įgyvendinti plačiajuosčio ryšio plėtros projektui skiriama 15,49 mln. Lt parama. Projekto įgyvendintoja numatyta Įstaiga.

2014 m. kovo 14 d. raštu Nr. 01-1-02-42 TEO LT, AB kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Finansų ministeriją dėl partnerystės sutarties su Europos Komisija, kuriame TEO LT, AB pareiškė mananti, kad Įstaigos įgyvendinami RAIN-2 ir PRIP projektai neva iškraipo konkurenciją ir mažina privačių investuotojų paskatas investuoti į plačiajuosčio ryšio technologijų plėtrą Lietuvoje. Įstaiga e. paštu yra pateikusi savo komentarus IVPK ir CPVA.

2014 m. balandžio 24 d. su Nacionaline mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta paramos skyrimo projektui „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ (toliau – PRIP projektas) sutartis, kuria iš Lietuvos 2007-2013 metų kaimo plėtros programos buvo skirta 17 214 127 Lt parama projektui įgyvendinti. Projekto metu planuojama įrengti apie 360 km šviesolaidinių kabelinių linijų kaimo vietovėse.

2014 m. balandžio 28 d. CVP IS paskelbta apie pradėtą PRIP projektui įgyvendinti skirtą pirkimą supaprastinto atviro pirkimo būdu „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“.

2014 m. gegužės 6 d. su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Alna Intelligence“ ir UAB „Blue Bridge“, pasirašyta techninės ir programinės įrangos pirkimo pardavimo sutartis, kuria buvo užbaigtos RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalingo pirkimo atviro konkurso būdu „Tinklo valdymo ir pagalbinės sistemos, jų centrai“ procedūros.

2014 m. gegužės 28 d., gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pradėtos RAIN-2 projektui reikalingo GIS informacinės sistemos pirkimo neskelbiamų derybų būdu procedūros.

2014 m. birželio 13 d. su UAB „InComSystems“ pasirašyta sutartis dėl RAIN-2 projekto informacinių stendų įrengimo, kuria buvo užbaigtos RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalingo mažos vertės pirkimo „Informaciniai stendai ir jų įrengimas“ procedūros.

2014 m. birželio 13 d. su UAB „InComSystems“ pasirašyta sutartis dėl PRIP projekto informacinių stendų įrengimo, kuria buvo užbaigtos PRIP projektui įgyvendinti reikalingo mažos vertės pirkimo „Informaciniai stendai ir jų įrengimas“ procedūros.

2014 m. birželio 16 d. pasirašyta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su AB Lietuvos radijo ir televizijos centru, kuria buvo išsinuomos įstaigos naujos buveinės patalpos.

2014 m. birželio 20 d. su UAB „BEN consulting“ pasirašyta sutartis dėl RAIN-2 viešinimo paslaugų, kuria buvo užbaigtos RAIN-2 projektui įgyvendinti reikalingo mažos vertės pirkimo „RAIN-2 viešinimo paslaugos“ procedūros.

2014 m. birželio 23 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos persiuntė Europos Komisijos paklausimą dėl atnaujintos RAIN-2 didelės apimties projekto paraiškos. Atsakymai į Europos Komisijos klausimus pateikti 2014 m. liepos 3 d.

Įstaiga 2014 m. liepos 3 d. parengė ir pateikė Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos atsakymus į Europos Komisijos paklausimą dėl atnaujintos RAIN-2 didelės apimties projekto paraiškos.

Gavus Europos Komisijos prašymą, 2014 m. liepos 3 d. Įstaiga kreipėsi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT), prašydama pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad RAIN-2 projekto metu planuojamos įrengti papildomos šviesolaidinės kabelinės linijos (apie 1000 km) neturės poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. 2014 m. liepos 11 d. minėta deklaracija buvo perduota Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK).

2014 m. liepos 16 d. darbo tvarka įvyko Įstaigos, IVPK ir VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) atstovų susitikimas, skirtas aptarti RAIN-2 projekto įgyvendinimo eigą. Susitikimo metu buvo sutarta užsakyti atlikti RAIN-2 projekto apimtyje vykdomos rangos sutarties (rangovas UAB „FIMA“), pagal kurią užsakyta įrengti apie 1000 km RAIN-2

šviesolaidinių kabelinių linijų, rizikų analizę, kuria būtų įvertinta rangos sutarties pažanga ir galimos jos įgyvendinimo rizikos.

2014 m. gegužės – liepos mėn. įvykdytos PRIP projektui įgyvendinti skirto viešojo pirkimo supaprastinto atviro pirkimo būdu „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“ procedūros (neskaitant pirkimo sutarties pasirašymo), kurių metu buvo priimtas sprendimas pirkimo nugalėtoja pripažinti ir sudaryti pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“. 2014 m. liepos 22 d. tiekėjas UAB „KRS“ pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui, kuriuo prašė pripažinti minėtą įstaigos sprendimą panaikinti, kartu prašydama pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti įstaigą nesudaryti pirkimo sutarties su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 29 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 29 d. nutartį, kuria buvo atmestas UAB „KRS“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti įstaigą nesudaryti pirkimo sutarties su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“, įstaiga 2014 m. rugpjūčio 1 d. su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“, pasirašė rangos sutartimi, pagal kurią tiekėjas įsipareigojo įrengti apie 400 km PRIP projekto šviesolaidinių kabelinių linijų.

2014 m. rugpjūčio 4 d. įstaiga su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pasirašė RAIN-2 projekto partnerystės sutarties pakeitimą, kuriuo buvo patikslintos RAIN-2 projekto administravimo komandos, sudarytos iš RAIN-2 projekto partnerių darbuotojų, funkcijos.

2014 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4-35 buvo pakeistas RAIN-2 projekto procedūrų vadovas. Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į 2014 m. rugpjūčio 4 d. RAIN-2 projekto partnerystės sutarties pakeitimą.

2014 m. rugpjūčio 14 d. pasirašyta GIS informacinės sistemos pirkimo–pardavimo sutartis su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Alna Intelligence“, UAB „Hnit-Baltic“ ir UAB „Cellular Expert“. Šios sutarties pasirašymu buvo užbaigtos RAIN-2 projektui reikalingo GIS informacinės sistemos pirkimo neskelbiamų derybų būdu procedūros, vykdytos gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

2014 m. rugsėjo 3 d. įvyko RAIN-2 projekto priežiūros komiteto (toliau – PK) posėdis, kurio metu pritarta PK pristatyti ataskaitai apie RAIN-2 projekto įgyvendinimo eigą bei rizikas, pritarta vykdyti RAIN-2 projekto termino pratęsimo procedūras, pritarta pristatytiems naujiems Įstaigos teikiamų RAIN tinklo paslaugų tarifams. PK taip pat įvertino kompetentingų valstybės institucijų atliktą TEO LT, AB skundo Lietuvos Respublikos Prezidentei dėl Įstaigos veiklos vertinimą – atsižvelgiant į tai, kad TEO LT, AB kreipimasi išnagrinėjo kompetentingos institucijos (Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos) ir į tai, kad pagrindo abejoti minėtų institucijų pozicija nėra, PK šiai institucijų pateiktai pozicijai pritarė.

UAB „OR consulting“ Įstaigos užsakymu atliko ir pateikė 2014 m. rugsėjo 10 d. projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio ryšio tinklo RAIN plėtra“ šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo sutarties „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo darbai“ vykdymo rizikų įvertinimą ir rekomendacijas, kuriose išsamiai įvertino minėtos rangos sutarties įgyvendinimo eigą ir rizikas.

2014 m. rugsėjo 17-18 dienomis Lenkijoje vyko Lodzės technologijų universiteto ir Europos Komisijos organizuojama konferencija „Skaitmeninis augimas ir sumanioji specializacija“ (angl. – “Digital Growth and Smart Specialisation”). Tai vienas iš S3 platformos (angl. - Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)) renginių, skirtų padėti Europos Sąjungos ir kaimyninėms šalims įgyvendinti inovacijų plėtros strategijas. Skaityti pranešimą šiame renginyje buvo pakviestas ir VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovas – teisininkas Gediminas Šečkus kuris savo pranešime pristatė ne tik RAIN infrastruktūros plėtros projektų tikslus, įgyvendinimo eigą bei rezultatus, bet ir svarbiausius sėkmės veiksnius, leidusius tuos rezultatus pasiekti.

Rugsėjo 19 d. Įstaigoje viešėjo delegacija iš Gruzijos technologijų ir inovacijų agentūros. Vizito tikslas – pasisemti gerosios praktikos plačiajuosčio ryšio plėtros įgyvendinimo klausimais. Įstaiga su svečiais iš Gruzijos pasidalino praktiniais RAIN, RAIN-2 ir PRIP projektų įgyvendinimo ir tinklo eksploatavimo aspektais.

2014 m. rugsėjo 29 d. Įstaiga su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pasirašė paramos skyrimo PRIP projektui sutarties pakeitimą, kuriuo buvo patikslinta mokėjimo prašymų pateikimo NMA tvarka.

2014 m. spalio – gruodžio mėn. įvykdytos PRIP projektui įgyvendinti skirto viešojo pirkimo supaprastinto atviro pirkimo būdu „Techninės pagalbos paslaugos“ procedūros, kurių metu buvo priimtas sprendimas pirkimo nugalėtoja pripažinti ir sudaryta pirkimo sutartis su UAB „Kelko“.

2014 m. spalio 10 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko posėdis, kuriame dalyvavo UAB „FIMA“, Įstaigos, Susisiekimo ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) ir VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) atstovai. UAB „FIMA“ prisiėmė atsakomybę dėl RAIN-2 projekto šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) įrengimo darbų rangos sutarties vykdymo vėlavimo, tačiau patikino, kad planuoja suspėti visus darbus atlikti iki 2015 m. birželio mėn. ir pateikė patikslintą darbų atlikimo grafiką.

2014 m. spalio mėn. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja Įstaigos buveinė, kurios adresas – Sausio 13-osios g. 10, Vilnius.

2014 m. spalio 7 d. Vilniaus apygardos teismas atmetė UAB „KRS“ ieškinį, kuriuo UAB „KRS“ prašė pripažinti Įstaigos sprendimą pirkimo supaprastinto atviro pirkimo būdu „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“ nugalėtoja pripažinti ir sudaryti pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“.

2014 m. spalio mėn. pradėta viešoji konsultacija su rinkos dalyviais dėl siūlomų naujų RAIN tinklo paslaugų tarifų. 20 suinteresuotų dalyvių pateikė nuomonę, iš kurių 18 pritarė, TEO LT, AB ir Asociacija „Infobalt“ pareiškė abejones, kurias pateikė ir Ryšių reguliavimo tarnybai bei Konkurencijos tarybai. Ryšių reguliavimo tarnybos ir Konkurencijos tarybos atsakymuose į TEO LT, AB abejones nėra prieštaravimų siūlomiems naujiems RAIN tinklo paslaugų tarifams.

2014 m. spalio 24 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko posėdis, kuriame dalyvavo UAB „FIMA“, Įstaigos, Susisiekimo ministerijos, IVPK ir CPVA atstovai. posėdyje, kuriame dalyvavo rangovo, IVPK, CPVA ir PI atstovai. UAB „FIMA“ posėdyje nurodė, kad pagal 2014 m. spalio 10 d. posėdyje pristatytą darbų atlikimo grafiką darbų atlikti nespės.

2014 m. spalio 30 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-410-(E) patvirtintas Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planas, kuriame, tarp kitų priemonių, numatyta plėtoti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą, statant bokštus ir tiesiant šviesolaidines kabelines linijas baltosiose šalies teritorijose, plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą kaimo vietovėse, prijungiant prie šviesolaidinio tinklo žemės ūkio / kaimo subjektus, peržiūrėti Įstaigos teikiamų paslaugų kainodarą ir tarifus.

2014 m. lapkričio 14 d. UAB „KRS“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį atmesti UAB „KRS“ ieškinį, kuriuo UAB „KRS“ prašė pripažinti Įstaigos sprendimą pirkimo supaprastinto atviro pirkimo būdu „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“ nugalėtoja pripažinti ir sudaryti pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“. Šiuo metu vyksta bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme.

2014 m. lapkričio 17–20 d. Įstaigos atstovai Gruzijos inovacijų ir technologijų agentūros kvietimu lankėsi Gruzijoje, kur Įstaigos atstovai pasidalino RAIN ir RAIN-2 projektų gerąja praktika su agentūros ir Gruzijos ekonomikos ir darnios plėtros ministerijos atstovais, Gruzijai rengiantis įgyvendinti projektą „Plačiajuostis ryšys visiems“.

2014 m. lapkričio 25 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-450 patvirtintas naujos sudėties RAIN-2 priežiūros komitetas.

2014 m. lapkričio 28 d. įvyko RAIN-2 projekto priežiūros komiteto posėdis, kuriame pritarta, kad būtų kreipiamasi į CPVA dėl RAIN-2 projekto termino pratęsimo ir kad Įstaiga parengtų ir su UAB „FIMA“, Susisiekimo ministerija ir Viešųjų pirkimų tarnyba suderintų ir pasirašytų papildomą susitarimą, kuriame būtų numatyta papildoma UAB „FIMA“ atsakomybė, apimanti visas negautas ES lėšas ir kt. dėl rangos sutarties nutraukimo galinčias atsirasti Susisiekimo ministerijos ir Įstaigos išlaidas.

2014 m. gruodžio 10 d. Vyriausybės pasitarime buvo iš esmės pritarta siūlymui turėti papildomą optinio ryšio kabelio atšaką, nutiestą Baltijos jūros dugnu į Frankfurtą (Vokietija), dalyvaujant bendrame su Suomijos valstybės kapitalo įmone „Corenet Oy“ projekte, už derybas dėl prisijungimo prie projekto sąlygų paskiriant Įstaigą.

2014 m. gruodžio 31 d. Įstaiga su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pasirašė paramos skyrimo PRIP projektui sutarties pakeitimą Nr. 2, kuriuo buvo patikslinta mokėjimo prašymų pateikimo NMA tvarka.

Įstaigos valdymas

Per 2014 m. įvyko šie reikšmingi Įstaigos valdymo įvykiai:

IVPK įvykdė pirkimo procedūras ir atrinko Įstaigos audito įmonę UAB „Jungtinė auditorių kontora“, su kuria 2013 m. kovo 20 d. buvo pasirašyta pirkimo sutartis dėl Įstaigos 2013 metų finansinės atskaitomybės audito paslaugos suteikimo.

2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 305 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ Įstaigos savininko teises ir pareigas pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

2014 m. balandžio 15 d. patvirtinta nepriklausomo auditoriaus išvada, kuria buvo patvirtinta, kad Įstaigos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai pateikia Įstaigos 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusį finansinių metų rezultatus.

2014 m. balandžio 24 d. įvyko Įstaigos tarybos posėdis, kurio metu buvo pritarta Įstaigos 2013 m. strateginio veiklos plano ataskaitai (2013 m. veiklos ataskaitai) ir pasiūlyta visuotiniam narių susirinkimui ją patvirtinti, taip pat patvirtinta Įstaigos 2014 m. 3 mėnesių strateginio veiklos plano ataskaita (2014 m. I ketvirčio veiklos ataskaita).

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. T-63 patvirtinta Įstaigos 2013 m. finansinė atskaitomybė.

2014 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius patvirtino vidaus audito ataskaitą Nr. VA/14-6, kuria buvo įformintos Įstaigos įgyvendinamo RAIN-2 projekto vidaus audito procedūros.

IVPK įvykdė pirkimo procedūras ir atrinko Įstaigos audito įmonę UAB „Jungtinė auditorių kontora“, su kuria 2013 m. kovo 20 d. buvo pasirašyta pirkimo sutartis dėl Įstaigos 2013 metų finansinės atskaitomybės audito paslaugos suteikimo.

2014 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir IVPK, vadovaudamasi 2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 305 „Dėl viešosios įstaigos „Plčiajuostis internetas“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“, pasirašė Įstaigos savininko turtinių ir neturtinių teisių perdavimo ir priėmimo aktą, kuriuo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija iš IVPK parėmė Įstaigos savininko teises ir pareigas.

2014 m. spalio 2 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-378 paskirta naujos sudėties Įstaigos taryba.

2014 m. lapkričio 3 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415 pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Įstaigos įstatai (Juridinių asmenų registre registruoti 2014 m. lapkričio 17 d.).


2014 m. lapkričio 7 d. įvyko įstaigos tarybos posėdis, kurio metu buvo pritarta Įstaigos 2014 metų 9 mėnesių strateginio veiklos plano ataskaitai (2014 m. III ketvirčio veiklos ataskaitai).

2014 m. gruodžio 31 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-542-(E) Įstaigos teikiamų paslaugų tarifai nustatyti nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusia nacionaline valiuta – eurai.

PASLAUGŲ TEIKIMAS


Per 2014 m. VŠĮ „Plčiajuostis internetas“ projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plčiajuostis tinklas RAIN“ ir „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plčiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ įgyvendinimo metu sukurtu tinklu suteikė ryšio operatoriams 408 naujas ryšio paslaugas. Iš jų 91 ryšio paslaugą šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas – 297,480 kilometro), 298 duomenų srauto perdavimo 100 Mb/s sparta paslaugas, 15 duomenų srauto perdavimo 1 Gb/s sparta paslaugų ir 4 ryšio paslaugas sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis (atstumas – 169 kilometrai).

RAIN tinklu teikiamos paslaugos, vnt.

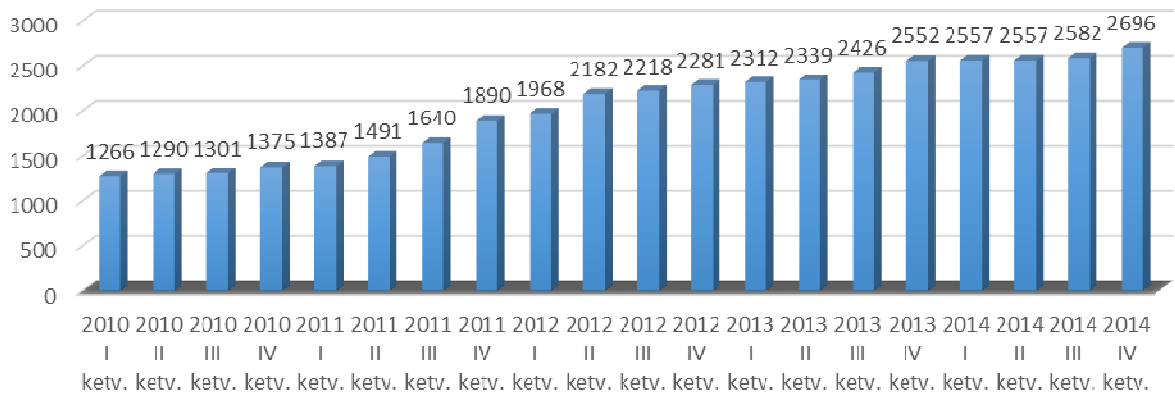

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ ryšio operatoriams iš viso teikė 2696 ryšio paslaugas. Iš jų 742 ryšio paslaugos buvo teikiamos šviesolaidinio kabelio skaidulomis (atstumas – 2955,746 kilometro), 3 ryšio paslaugos sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis (atstumas – 155 kilometrai) ir 1951 duomenų srauto perdavimo paslaugos.

Teikiamų paslaugų pasiskirstymas, vnt.

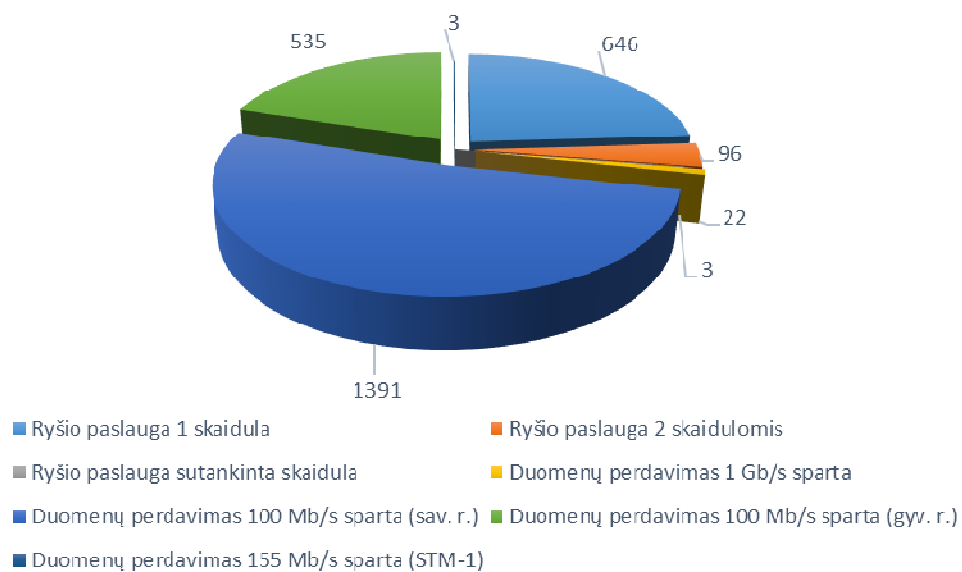

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ buvo sudariusi ryšio paslaugų teikimo sutartis su 47 elektroninių ryšių operatoriais.

ŠVIESOLAIDINIŲ KABELINIŲ LINIJŲ STATYBA IR EKSPLOATAVIMAS

Per 2014 metus eksploatavimo paslaugų teikėjams užsakyti vykdymui tinklo eksploatavimo operatyviniai veiksmai, gedimų šalinimas, infrastruktūros palaikymo ir plėtros darbai bei kitos veiklos

Pašalinta 10 - I lygio, 16 - II lygio, 2 – III lygio ir 6 - IV lygio pasyvinės tinklo dalies avarijų. Iš viso per 2014 m. buvo pateikti ir vykdyti 159 užsakymai (pagal visas sutartis), vykdyta jų atlikimo kontrolė. Atlikta darbų pagal 139 užsakymus (pagal visas sutartis).

2014 m. lapkričio 21 d. pasirašyta RAIN tinklo eksploatavimo sutartis infrastruktūros palaikymui ir plėtrai.

Regionuose per ataskaitinį laikotarpį įstaigos darbuotojai vykdė tinklo eksploatavimo, tinklo sutrikimų priežasčių nustatymo ir pašalinimo, aktyvių ir pasyvių tinklo elementų perjungimo, kabelio trasų nužymėjimo statybinių organizacijų atstovams, statybinių organizacijų ruošiamų topografinių nuotraukų, projektų tikrinimo, monitoringo, įrangos remonto darbus. Siekiant užtikrinti kokybišką įrangos veikimą sutrikus elektros energijos perdavimui, buvo atliekami UPS perkėlimo, rezervinio maitinimo naudojant generatorius organizavimo ir vykdymo darbai. Taip pat vykdyti naujai montuojamos įrangos įdiegimo priežiūros darbai.

Vykdamas projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ padidintos apimties šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbus buvo derinami rangovo siūlomi techniniai sprendimai bei projektai. Regionuose vykdyta techninė ŠKL įrengimo priežiūra, Rangovo prašymu atliktas objektų techninis patikrinimas Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Raseinių, Kauno, Švenčionių, Ukmergės, Molėtų, Ignalinos, Zarasų, Trakų, Šalčininkų, Kalvarijos Varėnos, Kazlų Rūdos, Kelmės, Šiaulių, Kupiškio savivaldybėse. Atliktas darbų užbaigimo priėmimas ir pasirašyti darbų užbaigimo aktai Pagėgių sav., Tauragės r., Zarasų r., Ignalinos r. Priimta 41,712 km. ŠKL.


Derinti rangovo siūlomi techniniai sprendimai pagal „Plaćiajuosćio ryšio infrastruktūros plėtros kaimo vietovėse“ projektą, patikrinti 25 projektai, jiems pateiktos pastabos, vykdyta ŠKL įrengimo darbų techninė priežiūra.

RAIN tinklo valdymas

Gedimai

2014 m. buvo užregistruoti 265 gedimai. Užregistruotų gedimų skaičių lyginant su 2013 metais yra pastebimas ženklaus gedimų sumažėjimas. 2013 m. buvo užregistruoti 368 gedimai.

Vertinant gedimų priežastingumą, daugiausiai – 46 proc. užregistruotų gedimų sudarė gedimai dėl elektros tiekimo sutrikimų, 13 proc. gedimų buvo užfiksuota klientų tinkluose, 3 proc. gedimų buvo kitų operatorių tinkluose, 8 proc. gedimų be prastovų ir 30 proc. gedimų su prastovom dėl įvairių priežasčių (kabelių nutraukimai, aktyvinės įrangos gedimai ir pan.). Lyginant 2013 metų ir 2012 metų gedimų priežastingumą, pastebėtina, kad gedimų dėl elektros tiekimo sutrikimų procentas yra toks pat – 46. Tai rodo, kad tinklo patikimumo didinimui skirtos investicijos mažino bendrą gedimų skaičių, bet ne gedimų dėl elektros tiekimo sutrikimų procentą, nes lygiagrečiai buvo vykdomi prevenciniai veiksmai, kurie taip pat mažino ir gedimų, kylančių dėl kitų priežasčių, skaičių. Minimų priemonių dėka pavyko ženkliai sumažinti bendrą gedimų skaičių. Gedimų statistika pagal priežastingumą pateikiama grafike:

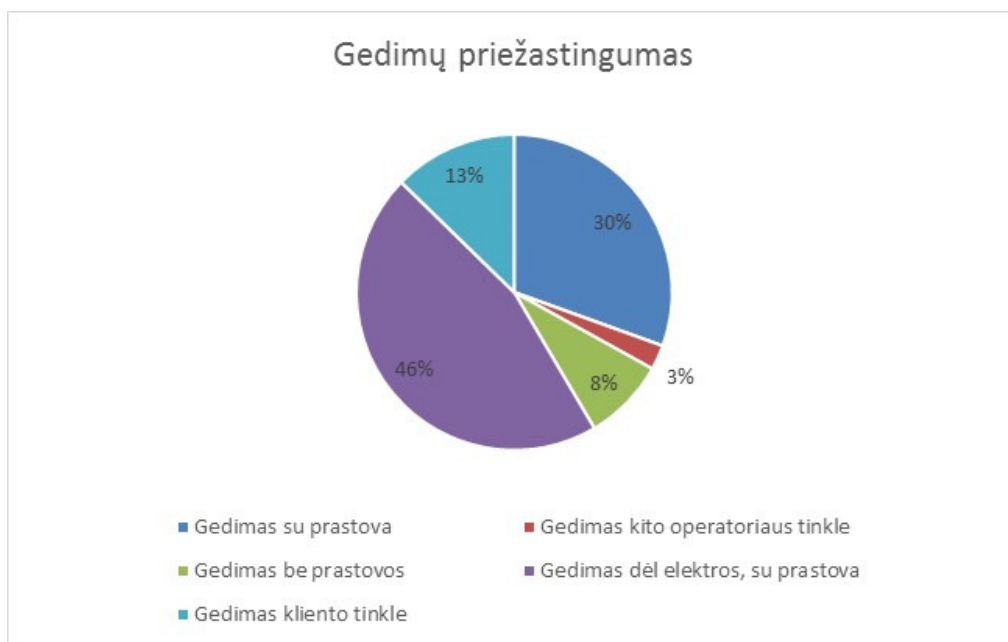

Absoliuti dauguma įvykusių gedimų neviršijo sutartyse su paslaugų gavėjais nustatytų gedimų atstatymo laikų. Pretenzijų iš paslaugų gavėjų dėl paslaugų teikimo neatitikimo sutartyse nustatytoms sąlygoms nebuvo gauta.

Paslaugų diegimas

Per 2014 metus iš viso gautos 537 paskyros, įdiegta 511 paskyrų. Likusios paskyros bus diegiamos 2015 metų pradžioje.

Tinklo kokybė

2014 m. įmonės teikiamų paslaugų vidutinis tinklo pateikiamumas buvo 99,64 proc. Lyginant su 2013 m. paslaugų pateikiamumas padidėjo 0,14 procentinio punkto. Nepaisant išaugusio tinklo ir teikiamų paslaugų skaičiaus pavyko padidinti tinklo pateikiamumo rodiklį nuosekliai diegiamų patobulinimų dėka. Toliau augant tinklui, atsirandant naujoms technologinėms platformoms ir sudėtingėjant tinklo struktūrai aukštą paslaugų pateikiamumo rodiklį planuojama išlaikyti naujų tobulesnių tinklo valdymo ir stebėjimo sistemų projektų įdiegimo išdavoje bei toliau diegiant į tinklo infrastruktūros patobulinius orientuotus

sprendimus bei analizuojant ir tobulinant Tinklo valdymo tarnybos atliekamus prevencinius veiksmus, reaguojant į valdymo sistemų teikiamus pranešimus.

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

Viešojoje įstaigoje „Plaćiajuostis internetas“ ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 26 darbuotojai, pabaigoje – 25 darbuotojai.

ĮSTAIGOS KAPITALAS

Įstaigos kapitalas (dalininko įnašas) metų pradžioje sudarė 159,0 tūkst. Lt. Per ataskaitinius metus dalininko kapitalas nepasikeitė.

ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI

2014 m. įstaiga dirbo pelningai veiklos rezultatas prieš apmokestinimą 132,5 tūkst. Lt.

Pajamos

Įstaiga per 2014 m. iš viso gavo – 7 863,8 tūkst. Lt pajamų. Iš jų: – 269,5 tūkst. Lt gauta įgyvendinant projektą „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuostis tinklas RAIN plėtra“; 194,3 tūkst. Lt gauta įgyvendinant projektą „Plaćiajuosćio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietoviese“. (Šios pajamos gautos faktiškai patirtoms išlaidoms kompensuoti) ir – 7 336,5 tūkst. Lt pajamų uždirbta už suteiktas paslaugas iš RAIN projekto metu sukurto tinklo. Per 2014 m. įstaiga – 58,5 tūkst. Lt gavo kitos veiklos pajamų ir – 5,0 tūkst. finansinės veiklos pajamų .

Valdymo išlaidos

Įstaigos planuotos sąnaudos per 2014 m. – 8 358,6 tūkst. Lt. Įstaigos sąnaudos per 2014 m. sudaro 7 731,3 tūkst. Lt arba 92,5 % planuotųjų. Iš jų: – 269,5 tūkst. Lt patirta išlaidų įgyvendinant projektą „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuostis tinklas RAIN plėtra“ ir – 194,3 tūkst. Lt patirta išlaidų įgyvendinant projektą „Plaćiajuosćio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietoviese“ (išlaidos yra kompensuotos iš projekto. Per 2014 m.

Įstaiga padengė 7 119,3 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių sąnaudų. Per 2014 m. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė 134,4 tūkst. Lt.

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2014 m. planas	2014 m. faktas	% 2014 m. faktas su 2014 m. planu
1.	PERSONALO IŠLAIKYMAS	1 878,7	1 591,8	84,7
2.	BIURO IŠLAIKYMAS	25,0	29,0	116,0
3.	TARNYBINIO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	0,0	0,0	0,0
4.	RYŠIŲ PASLAUGOS	109,5	84,7	77,4
5.	ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	172,0	146,1	84,9
6.	REKLAMA, LABDARA	20,0	11,3	56,5
7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	40,5	48,4	119,5
8.	DRAUDIMAS	3,0	2,4	80,0
9.	MOKESČIAI	2,9	2,4	82,8
10.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	6,0	3,9	65,0
11.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	129,0	134,4	104,2
12.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS	360,0	318,9	88,6
13.	KITOS SĄNAUDOS	5 610,0	5 358,1	95,5
15.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	8 356,6	7 731,3	92,5

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.

Investicijos

Įstaigos 2014 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytos Įstaigos investicijos – 200,0 tūkst. Per 2014 m. viso investicijų – 271,8 tūkst. Lt. Iš jų: – Įstaigos investicijos 194,6 tūkst. Lt ir 77,2 tūkst. Lt PRIP nebaigtos statybos investicijų.

Kitos išlaidos

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ valdymo išlaidos sudarė 3 487,1 tūkst. Lt.

Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2014 m. vadovavo direktorius Gytis Liaugminas, per ataskaitinį laikotarpį įstaigos vadovo darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos per finansinius metus 131,8 tūkst. Lt.

Viešojoje įstaigoje „Plčiajuostis internetas“ išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms – nėra.

Viešojoje įstaigoje „Plčiajuostis internetas“ išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims – nėra.

Direktorius

Gytis Liaugminas

1 lentelė. Uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Vertinimo kriterijai	Rodikliai		
				2013 m. faktas	2014 m. planas	2014 m. faktas
1.	Teikti didmenines paslaugas	Teikti didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN ir RAIN-2 projektų metu sukurtą infrastruktūrą	Suteiktų elektroninių ryšių paslaugų skaičius (augančiais sk.)	2552	2690	2696
2.	Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę	Parengti ir įgyvendinti technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą	Vidutinis paslaugų pateikiamumas (proc.)	99,5	99,2	99,6
3.	Optimaliai panaudoti sukurtą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą	Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias optimalų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą	Miestelių ir kaimų, kuriuose teikiamos plačiajuosčio tinklo paslaugos santykis su visais prie plačiajuosčio tinklo prijungtų miestelių ir kaimų skaičiumi (proc.)	72,8	70	74
4.	Sukurti RAIN-2 projekto šviesolaidinę infrastruktūrą	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Miestelių ir kaimų, prijungtų prie sukurto plačiajuosčio tinklo skaičius (augančiais sk.)	775	950	784
5.	Įrengti RAIN-2 projekto plačiajuosčio tinklo objektus (įvadás)	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Įrengtų tinklo objektų (įvadás) skaičius (augančiais sk.)	2461	3300	2480
6.	Sukurti PRIP projekto šviesolaidinę infrastruktūrą	Kontroliuoti vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinti techninius sprendimus ir projektus	Sukurtos šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (km, augančiais sk.)	-	50	50,3
7.	Įrengti PRIP projekto plačiajuosčio tinklo objektus (įvadás)	Kontroliuoti vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinti techninius sprendimus ir projektus	Įrengtų tinklo objektų (įvadás) skaičius (augančiais sk.)	-	20	44
